



CAMMESA

Previsión Semanas 15 y 16/24

Despacho Energético

Gerencia de Coordinación Operativa, 12/04/24

Pronóstico de temperaturas en Buenos Aires

(fuente SMN)



17.1°C

Algo nublado

Actualizado: 06h

Humedad: 64 %

Presión: 1021.7 hPa

Viento: Noreste a 9 km/h

Visibilidad: 10 km

Sol



07:15



18:33

Fuente SHN

Pronóstico para los próximos 7 días

Pronóstico oficial del día viernes, 12 de Abril de 2024 - actualizado a las 06:36 horas

Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
Mín 14°C	Mín 18°C	Mín 18°C	Mín 20°C	Mín 17°C	Mín 15°C	Mín 14°C
Máx 21°C	Máx 21°C	Máx 22°C	Máx 23°C	Máx 22°C	Máx 24°C	Máx 22°C

 Viernes, 12 de Abril de 2024

Tiempo

Mañana	Tarde	Noche
 Mayormente nublado	 Mayormente nublado	 Lluvias aisladas

Prob. Precipitación	0 - 10%	0 - 10%	10 - 40%
Temperatura (°C)	19	21	19
Viento (km/h)	23 - 31	23 - 31	23 - 31
Dirección Predominante	E	E	E
Ráfagas (km/h)	-	42 - 50	42 - 50



Pronóstico de temperaturas en Buenos Aires

(fuente Weather Channel)

Hoy	20°/18°		Mayormente nublado	8%	E 26 km/h
sáb 13	20°/18°		Lluvia débil / Viento	90%	ESE 35 km/h
dom 14	21°/20°		Lluvia débil	87%	E 31 km/h
lun 15	22°/17°		Tormentas	99%	NE 25 km/h
mar 16	20°/15°		Chubascos matinales	35%	ONO 28 km/h
mié 17	22°/14°		Soleado	3%	O 25 km/h
jue 18	23°/15°		Soleado	5%	ONO 17 km/h
vie 19	23°/16°		Mayormente soleado	15%	NNO 16 km/h
sáb 20	22°/17°		Parcialmente nublado	24%	NNE 13 km/h
dom 21	21°/16°		Lluvia débil	60%	NNE 13 km/h
lun 22	21°/16°		Chubascos	57%	ENE 14 km/h
mar 23	20°/16°		Chubascos	60%	ENE 15 km/h
mié 24	20°/15°		Lluvia débil	60%	NE 16 km/h
jue 25	18°/13°		Chubascos	60%	SE 17 km/h
vie 26	19°/13°		Chubascos	40%	ENE 15 km/h



Escenario previsto



Importación: Se prevé importación comercial desde Chile por ser competitiva contra el marginal de nuestro sistema.

Exportación: BRASIL y URUGUAY: Se realizó oferta con confirmación diaria.

Gas y Combustible alternativo: Se prevé un gas de 39.1 Mm³ para esta semana y 35.8 Mm³ para la semana próxima. El despacho de la próxima semana lo completa: 1000 m³ de GO.




Salto Grande: 12 unidades disponibles. Aportes actuales en 5.000 m³/s, cerrando en 9.500 m³/s medios la semana próxima.

Yacyretá: Opera con despacho plano lunes, martes, sábado y domingo, el resto de los días empuntada. Entrante promedio en el orden de 9.200 m³/s. ANDE toma 500 MW en horario de pico, con sistema Itaipú/ANDE/Yacyretá desacoplados.

Comahue: Caudales entrantes: Limay 82 m³/s, Collón Curá 64 m³/s y Neuquén 68 m³/s, con tendencia decreciente.

Chañar: Erogando 192 m³/s por optimización de mediano plazo.

Arroyito: Erogando 348 m³/s por optimización de mediano plazo.

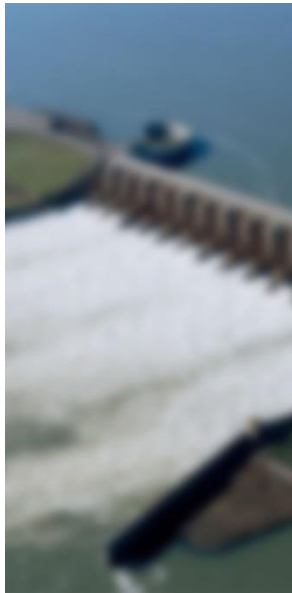

Situación parque generador

CENTRAL	MAQUINA	ESTADO	FECHA	MOTIVO
SAN PEDRO	TG01	Indisponible	17 al 19-abr	Mantenimiento Estacional
	TG02	Indisponible	23 al 25-abr	Mantenimiento Estacional
	Central	Indisponible	15-abr al 07-may	Indisponible con combustible líquido
ROJO	TG01	Indisponible	20 al 24-abr	Mantenimiento Estacional
	TG02	Indisponible	15 al 19-abr	Mantenimiento Estacional
PILAR	TG11	Indisponible	15 al 24-abr	Mantenimiento Estacional
TERMOANDES	TG01	Indisponible	14-abr al 27-abr	Mantenimiento Estacional
	TG02	Indisponible	14-abr al 25-may	Mantenimiento Estacional
	TV01	Indisponible	14-abr al 14-may	Mantenimiento Estacional
NECOCHEA	TV01-02	Indisponibles	Sin previsión	
COSTANERA	TV04-06	Indisponibles	Sin previsión	
PUERTO	TV07-TV08	Limitadas	Sin previsión	a 130MW y 120MW por conservación de calderal
MAR DEL PLATA	TG13-TG20	Indisponibles	Sin previsión	
L.CAMPANA (AUTOGEN)	TG01	Indisponible	Sin previsión	
BRAGADO	TG03	Indisponible	10-may	Mantenimiento Estacional
ANCHORIS	U2	Indisponible	2-may	Mantenimiento Estacional
PILAR BS AS	U01	Indisponible	15 al 22-abr	Mantenimiento Estacional
ING WHITE (BBLM)	U02	Indisponible	16 al 23-abr	Mantenimiento Estacional
LOMA DE LA LATA	MOTORES	Indisponible	19-abr	Mantenimiento Estacional
SAN FRANCISCO	TG02	Indisponible	sin previsión	Indisponible forzada
DEAN FUNES	TG02	Indisponible	sin previsión	Indisponible forzada
V. MARIA	TG03	Indisponible	sin previsión	Indisponible forzada
LEVALLE	TG02	Indisponible	sin previsión	Indisponible forzada
CERRI ECOENERGÍA	TV01	Indisponible	15 al 20-abr	Mantenimiento Estacional



Situación parque generador

CENTRAL	MAQUINA	ESTADO	FECHA	MOTIVO
YACYRETÁ	U04	Indisponible	31-jul	Mantenimiento Estacional.
	U01	Indisponible	10-may	Mantenimieno Estacional
	U06	Indisponible	18 al 26-abr	Mantenimieno Estacional
SALTO GRANDE	U08	Indisponible	24-abr	Mantenimiento Estacional
	U10	Indisponible	30-abr	Mantenimiento Estacional
CHOCON	U01	Indisponible	14-abr	Mantenimiento Estacional
P.P LEUFÚ	U01	Indisponible	18-abr	Mantenimiento Estacional
	U03	Indisponible	18-abr al 28-jun	Mantenimiento Estacional
RIO GRANDE	U01 - U04	Indisponibles	Sin previsión	Continúan indisponibles por Falla Estatórica
FUTALEUFÚ	U02	Indisponible	17-abr	Mantenimiento Estacional
NIHUILES	U206	Indisponible	19-abr	Mantenimiento Estacional




Perspectivas para la próxima semana


Balance Semanal			Semana 15		Semana 16	
			8/4/2024 - 14/4/2024		15/4/2024 - 21/4/2024	
			Gwh	MWmed	Gwh	MWmed
	Demanda		2474	14726	2474	14729
	Exportación		71	422	76	452
	Térmico		1443	8591	1308	7787
	Hidráulico		522	3105	568	3382
	Nuclear		283	1687	283	1687
	Renovable		294	1749	383	2281
	Importación		7	45	7	44
	Tipo	Unidad	Semana 15		Semana 16	
Consumo Combust.	Gas	Mm3/día	39		38	
	FO	Miles de Ton	0		0	
	GO	Miles de m3	1		1	
	Carbón	Miles de Ton	0		0	
Despacho MW med	ALICURA		0		0	
	PIEDRA		208		197	
	CHOCON		144		209	
	P.BANDERITA		124		116	
	FUTALEUFÚ		192		190	
	SALTO		722		776	
	YACYRETA		988		1274	
Niveles (msnm)			Hoy	Domingo	Domingo	
	ALICURA		702.80	703.27	704.01	
	PIEDRA		586.84	586.67	586.37	
	CHOCON		378.01	378.03	377.87	
	P.BANDERITA		414.89	414.76	414.55	
	FUTALEUFÚ		488.28	488.34	488.62	
	SALTO		34.85	35.04	35.23	




Evolución Cota Alicura

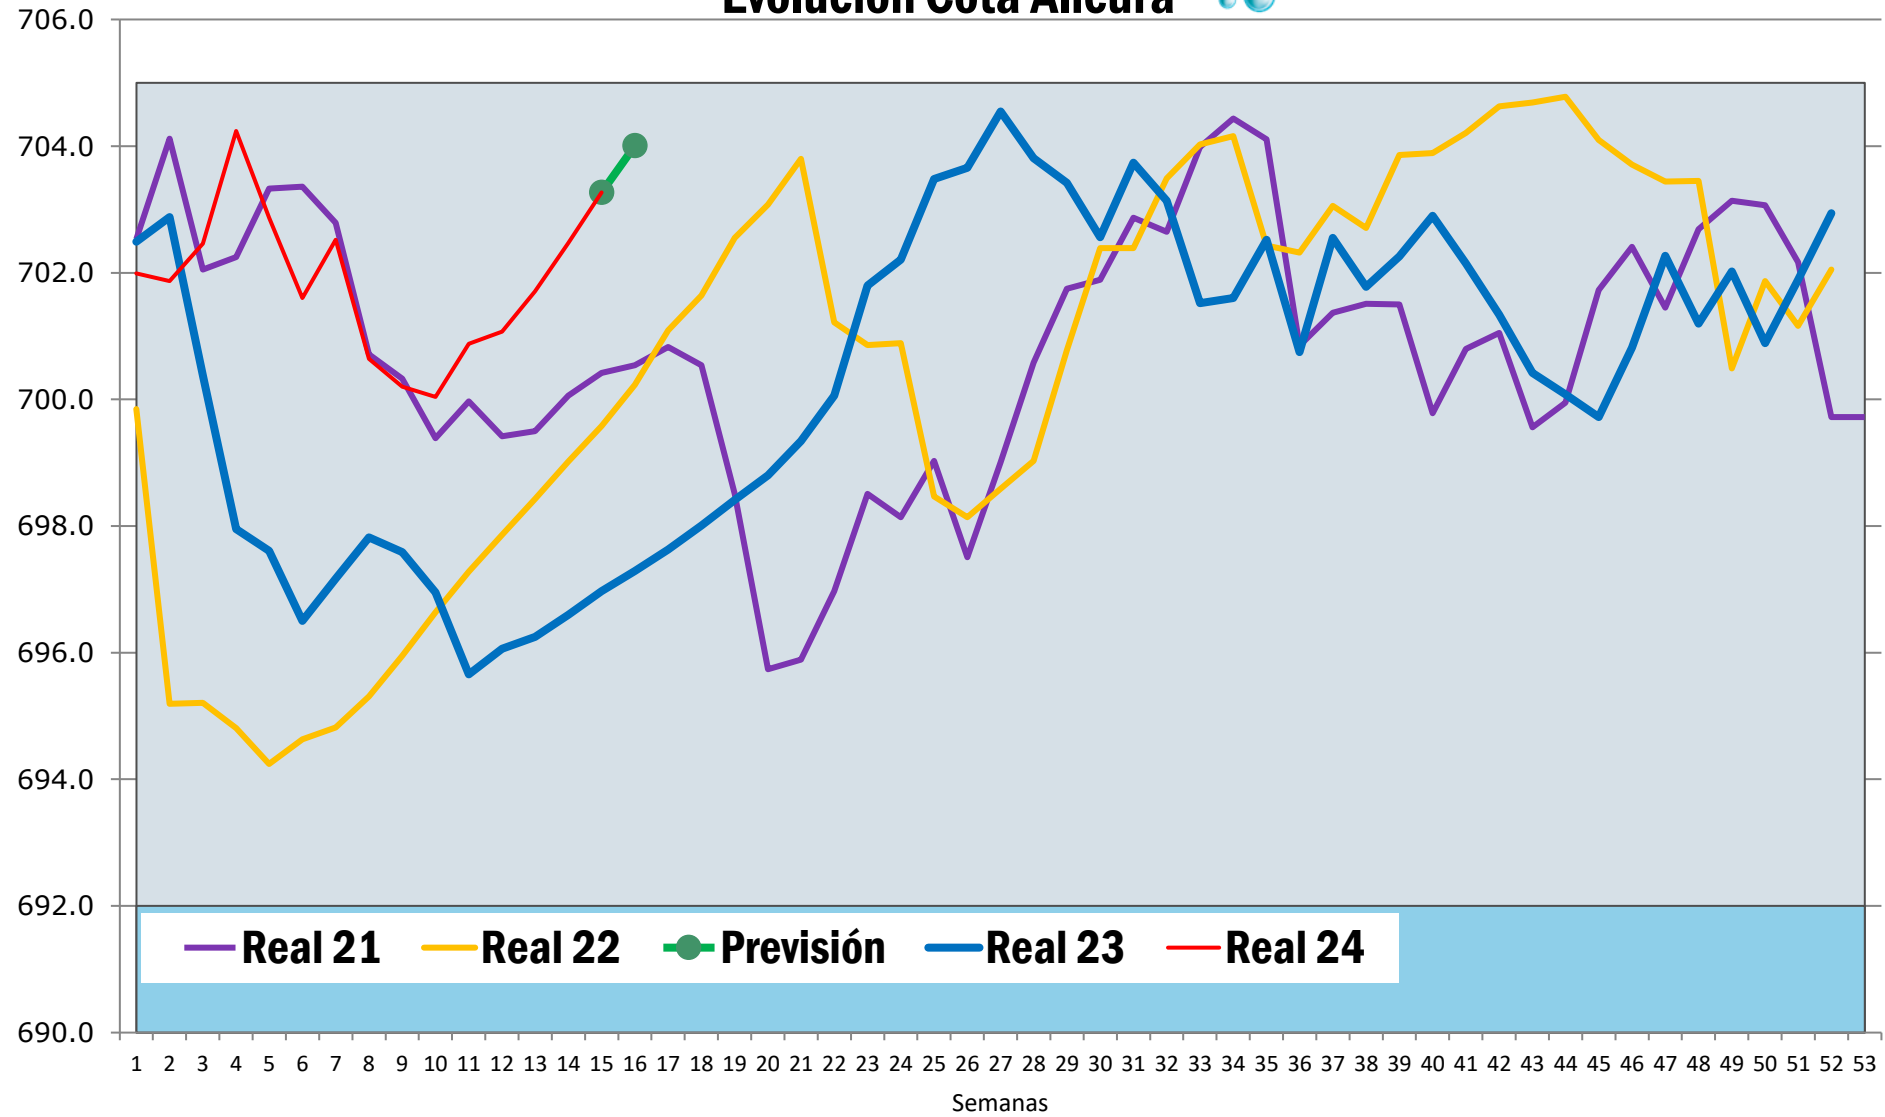


Evolución Cota Piedra del Águila

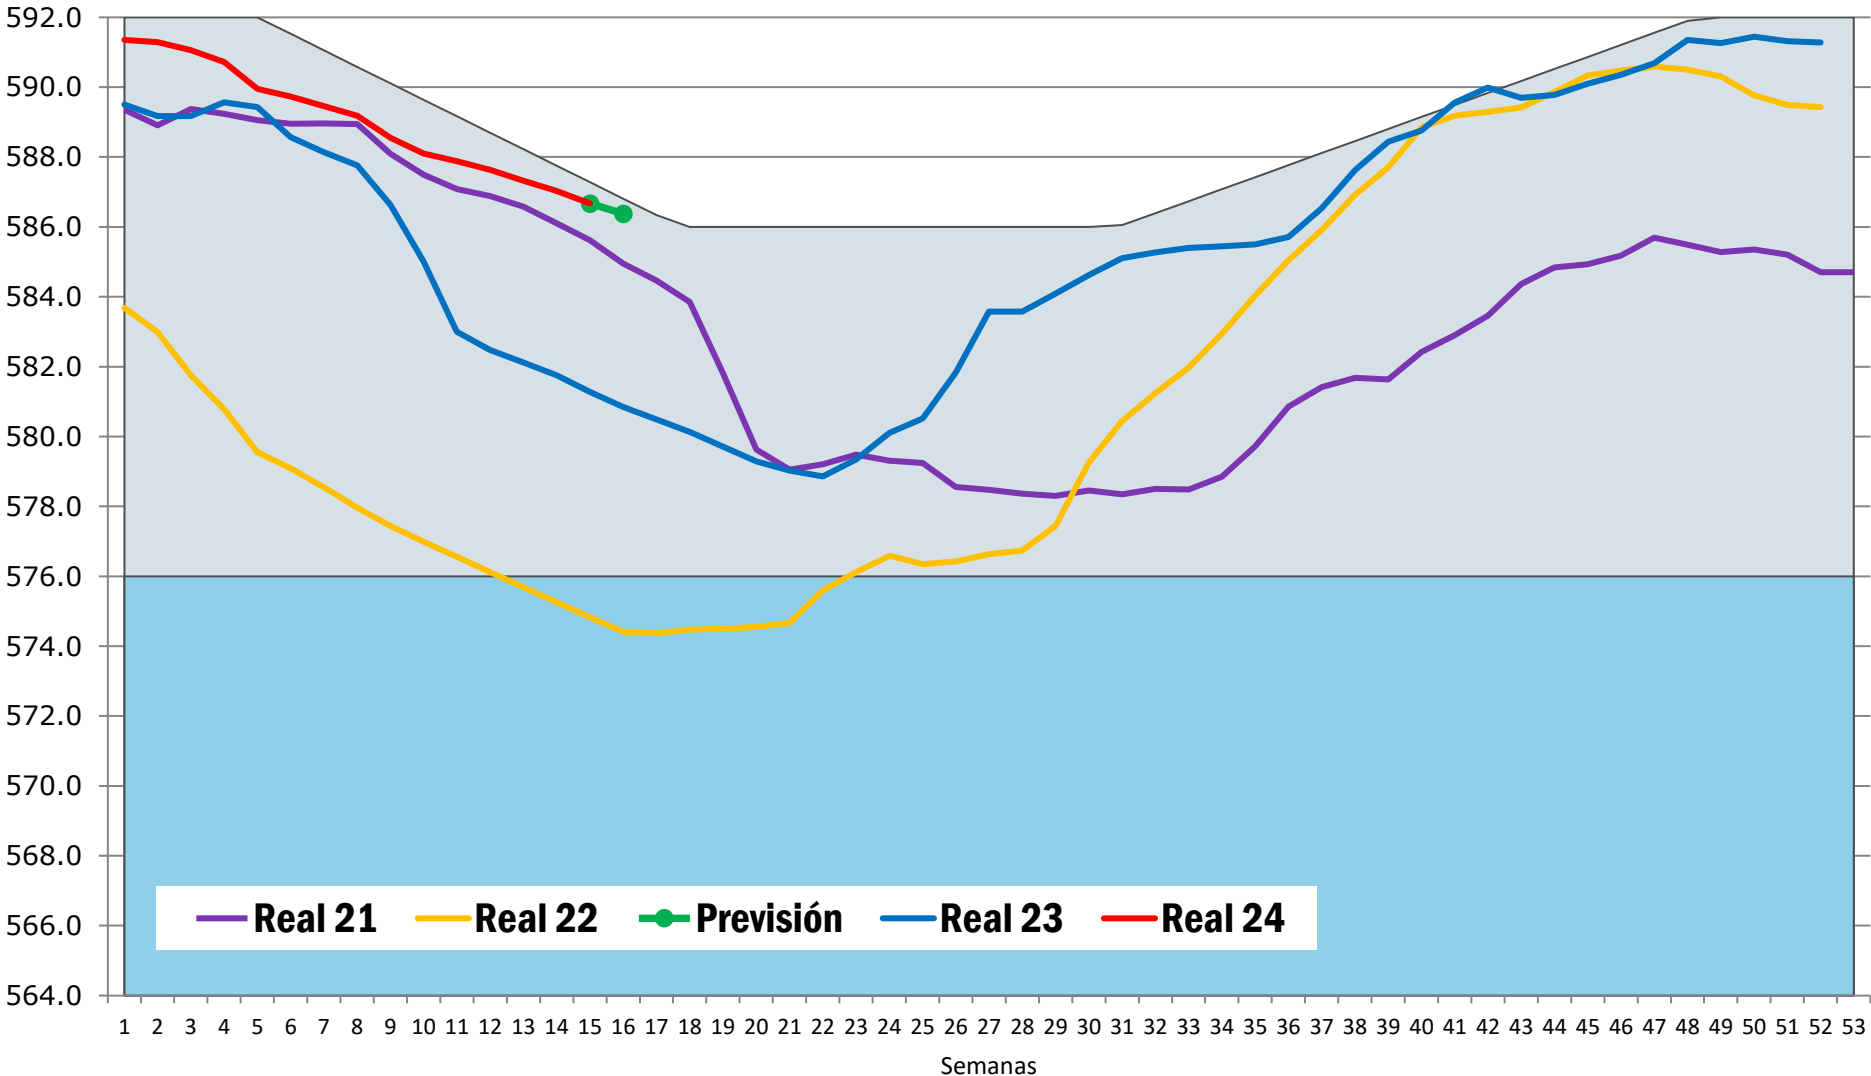


Evolución Cota Chocón

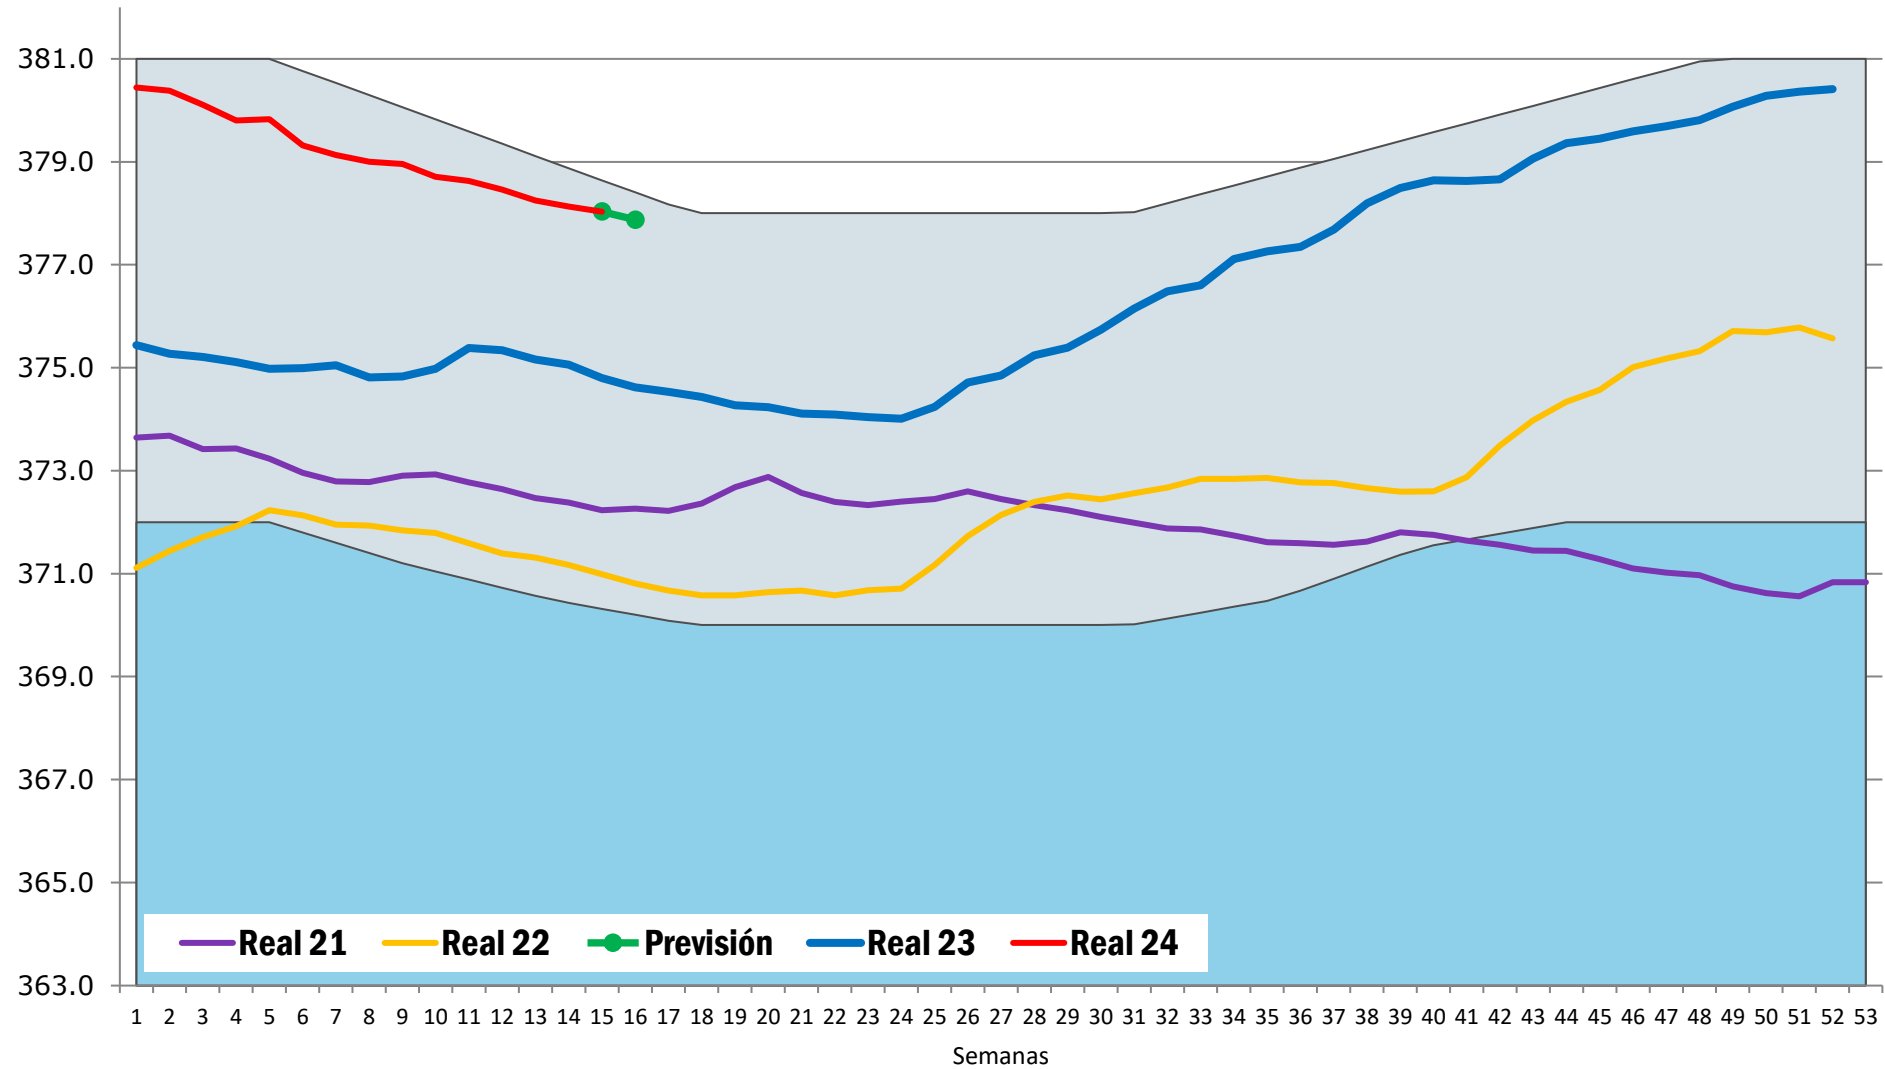

Evolución Cota Planicie Banderita

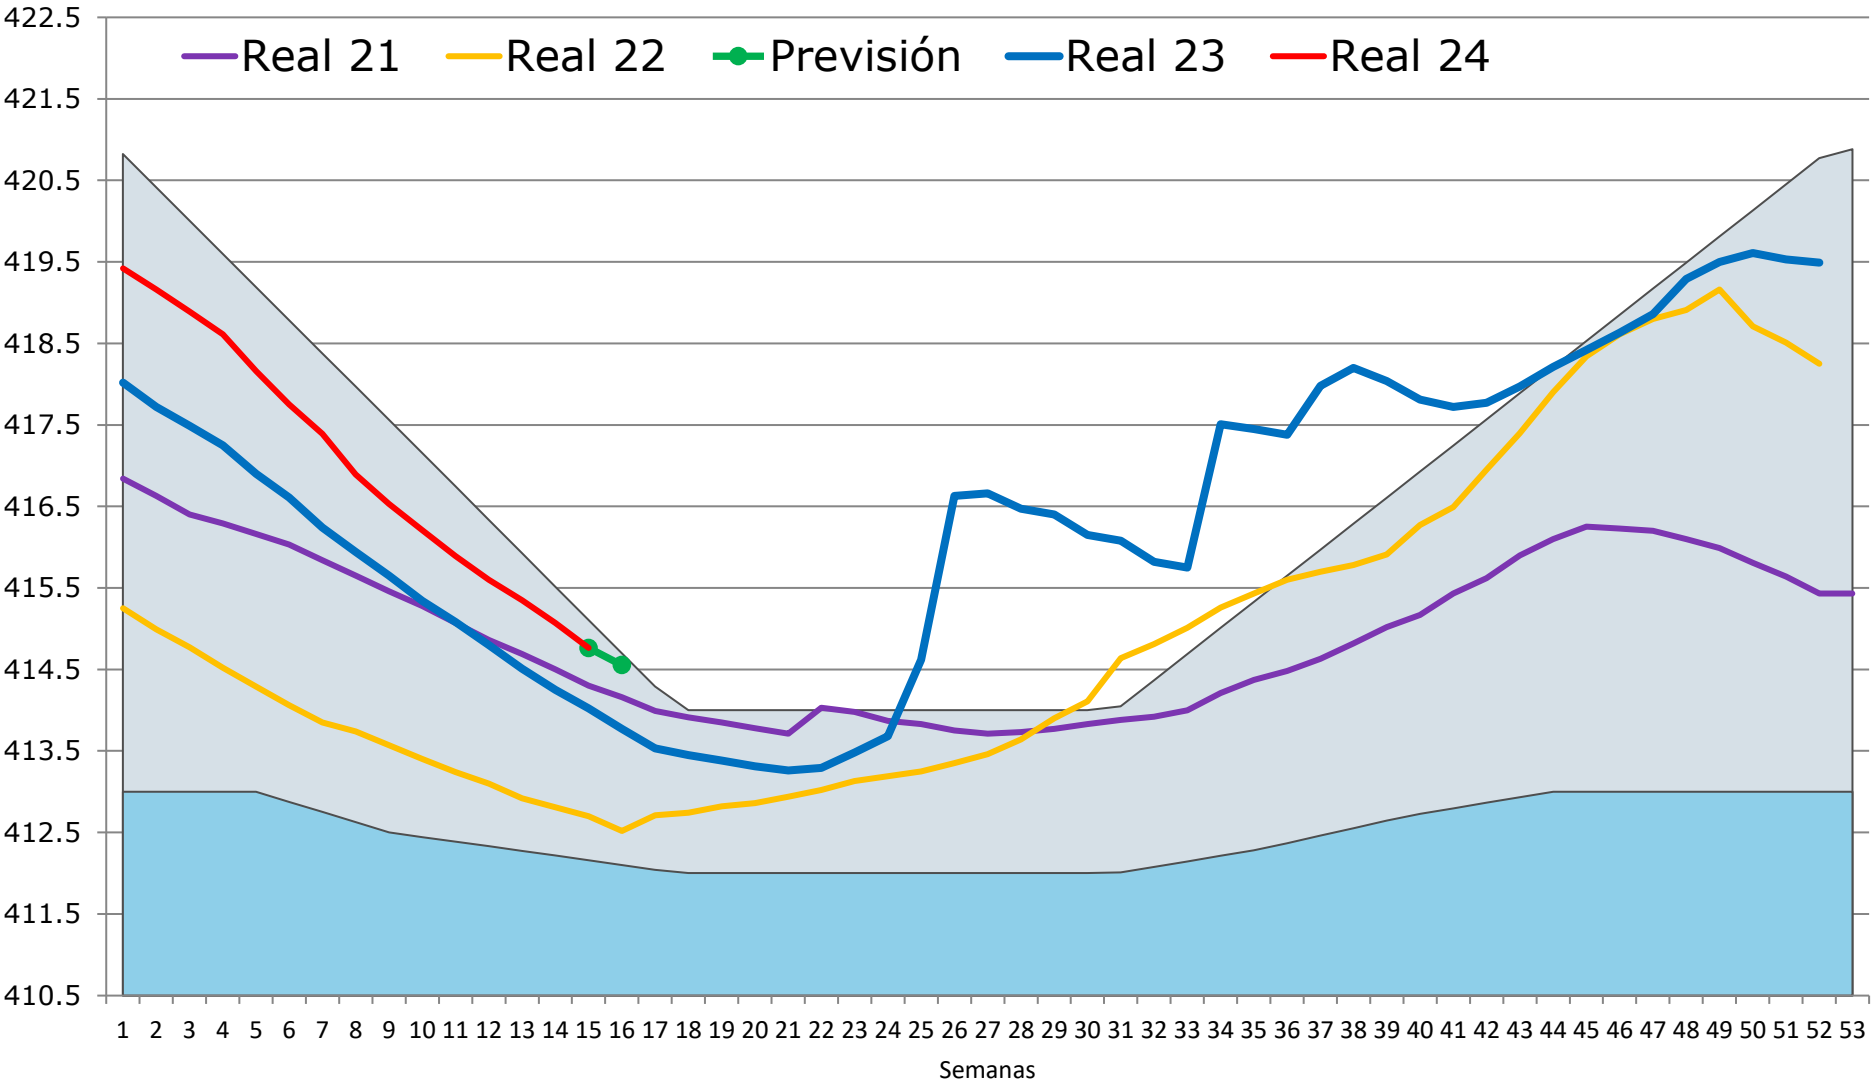

Evolución Cota Futaleufú

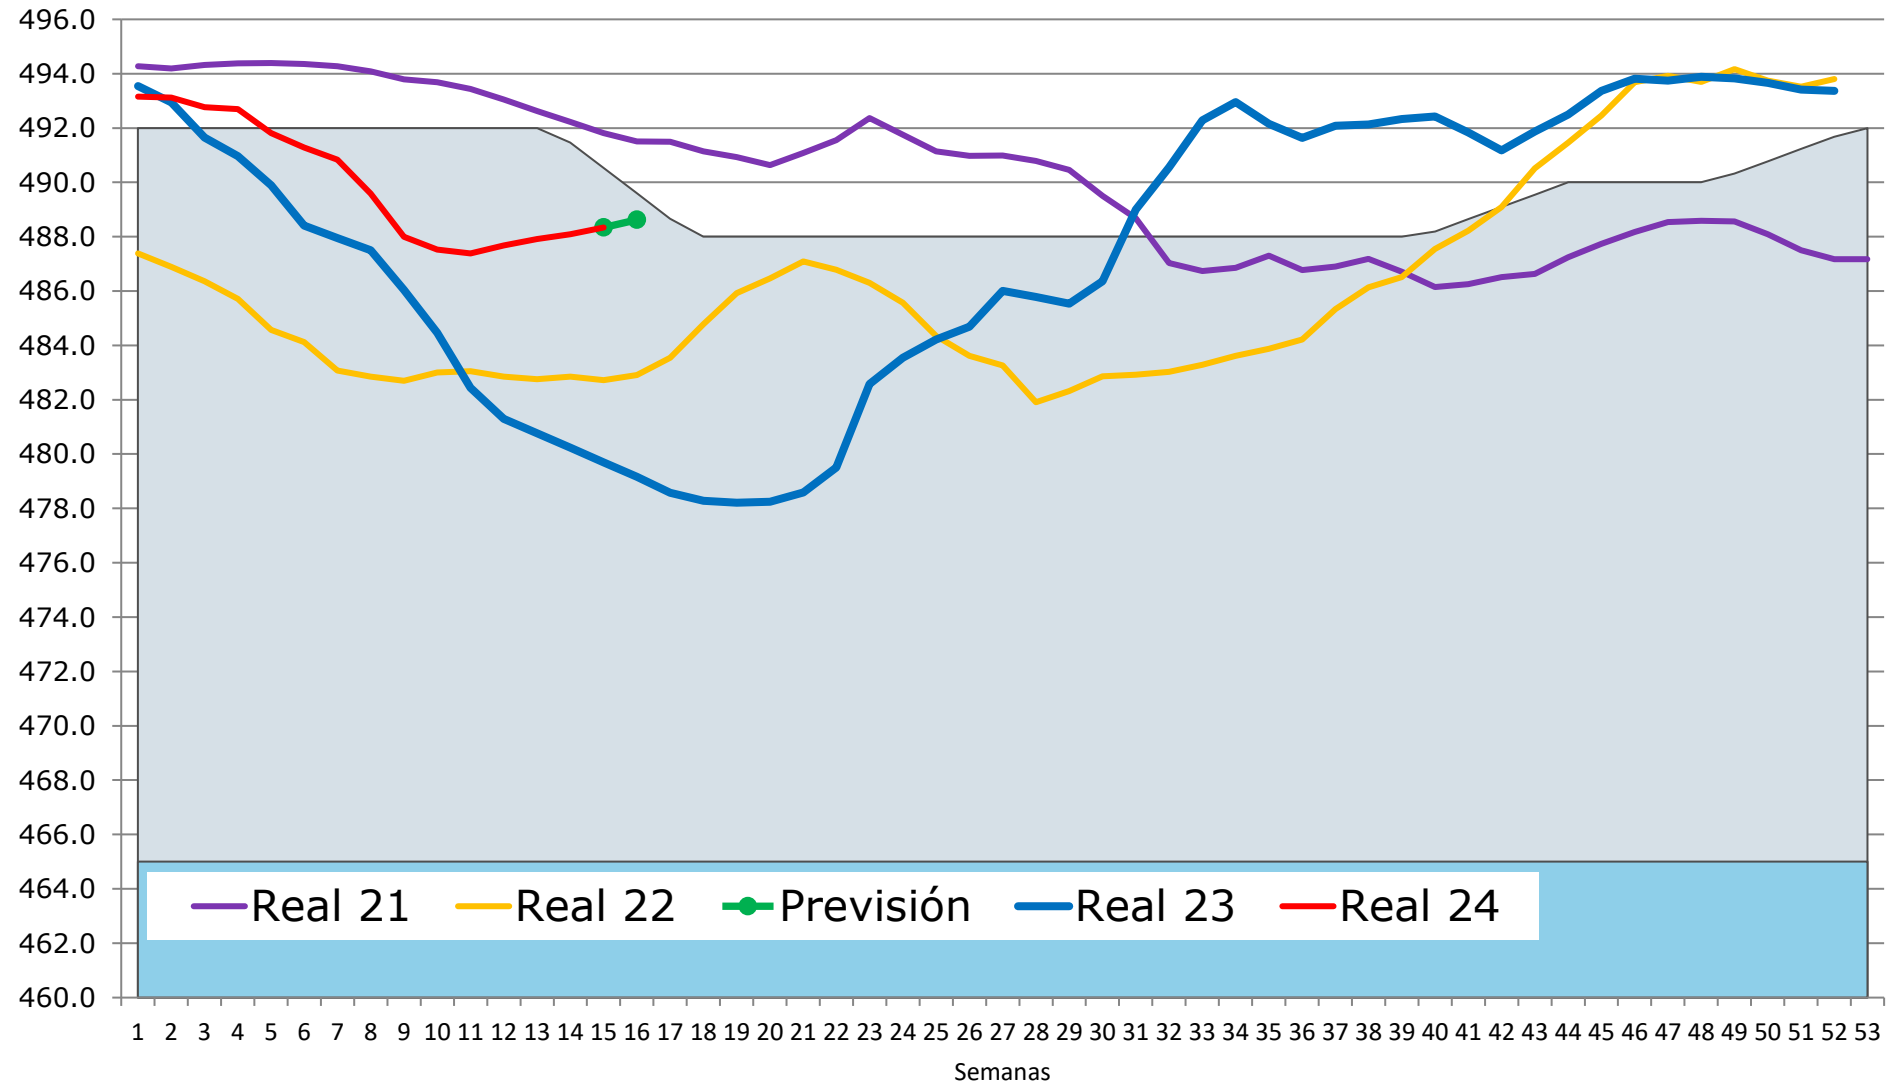

Sistema de Transporte y Distribución – Semana 16

Condiciones previstas de Operación en el STAT (Sistema de Transporte en Alta Tensión):



Equipos del STAT indisponibles:


- F/S indisponible la Interconexión de 220 kV Clorinda (ARG) – Guarambaré (PAR), por torre caída, sin previsión de disponibilidad.
- F/S indisponible el Compensador Sincrónico N°3 de la E.T. Ezeiza, para mantenimiento. **Los trabajos están demorados, sin previsión de disponibilidad.**
- F/S indisponible el Compensador Sincrónico N°4 de la E.T. Ezeiza, para mantenimiento. **Los trabajos están demorados, sin previsión de disponibilidad.**
- El 05/04 entraron E/S las Líneas de 220 kV Ramallo - Acindar 1 y 2, se encontraba F/S desde el 09/03 con torres caídas debido a fuertes tormentas en el área.



Sistema de Transporte y Distribución – Semana 16

TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RELEVANTES


#	EQUIPO	PROPIETARIO	TRABAJO	S 13	D 14	L 15	M 16	M 17	J 18	V 19
1	Línea de 500 kV Bahía Blanca - Olavarría 1	TRANSENER	Normalización pendiente de Emergencia Dic2023 en Conductor Morsetería, separadores	X	X					
2	Línea de 500 kV Paso Patria - Rincón 1	TRANSENER	para normalización, enmorsetado y colocación de espaciadores Post-Colapso	X	X	X	X			
3	Autotransformador 3 (500/132 kV – 300 MVA) de ET Henderson - 300MV	TRANSENER	reemplazo de los contadores de descarga de los descargadores de acometida	X						
4	Transformador 1 (500/132 kV – 300 MVA) de ET Resistencia	TRANSENER	Trabajos correctivos en CMT 33kV + Imágenes Térmicas T1RS + Interruptor	X						
5	Capacitor 5 de ET Ezeiza	TRANSENER	Repara perdidas de SF6	X						
6	Línea de 220 kV Esperanza - Río Turbio 1	TRANSENER	para colocar contrapesos sobre conductores de línea		X					
7	Transformador 3 de Santo Tomé	TRANSENER	Ensayos por cambio de TI 5JC06 T fase T debido a pérdida de aceite		X	X				
8	Línea de 500 kV Henderson - Macachín 2	TRANSENER	Mantenimiento general			X	X	X	X	X
9	Línea de 500 kV Ramallo - Rosario Oeste 1	TRANSENER	Correccion de pendiente por emergencia				X	X	X	X
10	Línea de 220 kV Los Reyunos - Río Diamante 1	TRANSENER	Mantenimiento general				X	X		
11	Barra B de 500 kV de Bahía Blanca	TRANSENER	Mantenimiento General de Barra				X	X	X	
12	Barra D de 500 kV de Bahía Blanca	TRANSENER	Mantenimiento General de Barra				X	X	X	

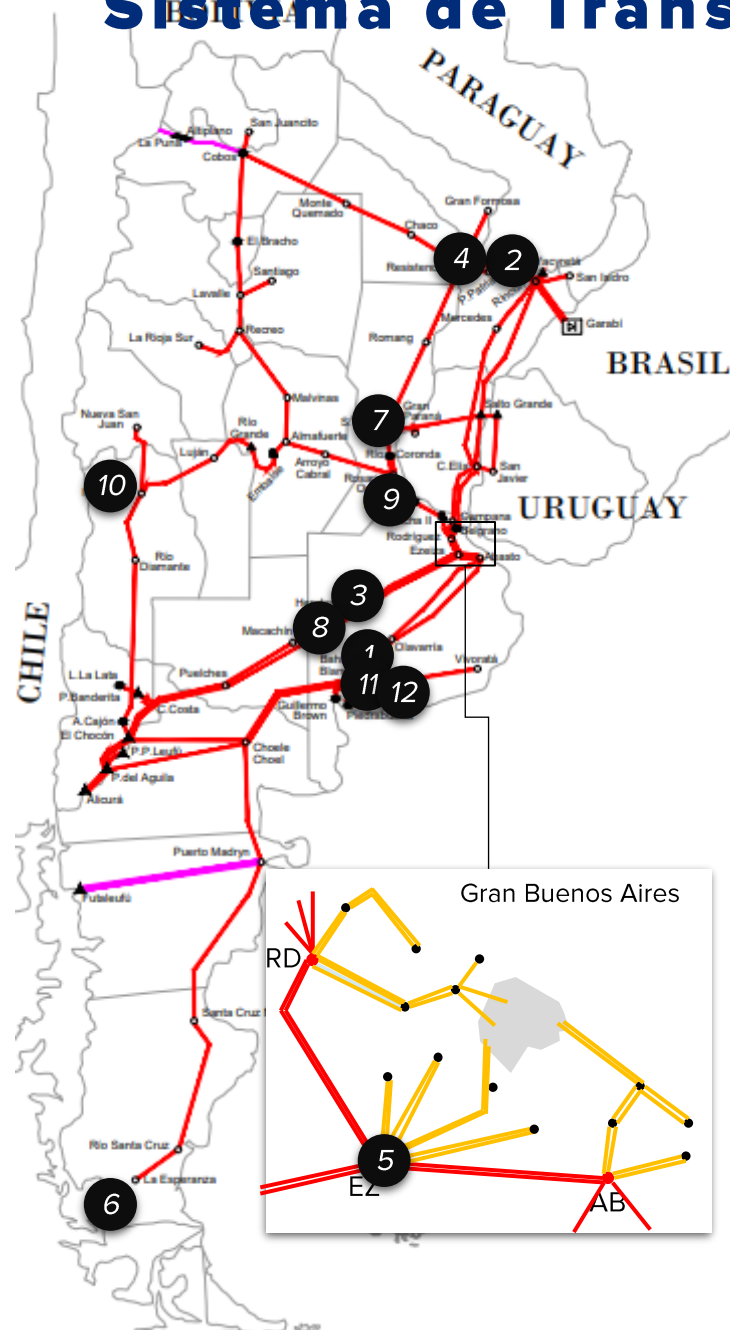

Sistema de Transporte y Distribución – Semana 16

TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RELEVANTES

#	EQUIPO	PROPIETARIO	TRABAJO	S 13	D 14	L 15	M 16	M 17	J 18	V 19
13	Barra A de 500 kV de Puelches	TRANSENER	Mantenimiento General de Barra				X			
14	Línea de 500 kV Almafuerite - Malvinas 1	TRANSENER	Mantenimiento General						X	x
15	Compensador Sincrónico 2 de ET Ezeiza	TRANSENER	Mantenimiento trimestral del CAR						X	X
16	Capacitor Serie 2 de ET Olavarría	TRANSENER	Control Anual de Banco						X	X
17	Barra A 500 kV Almafuerite	TRANSENER	Mantenimiento							X

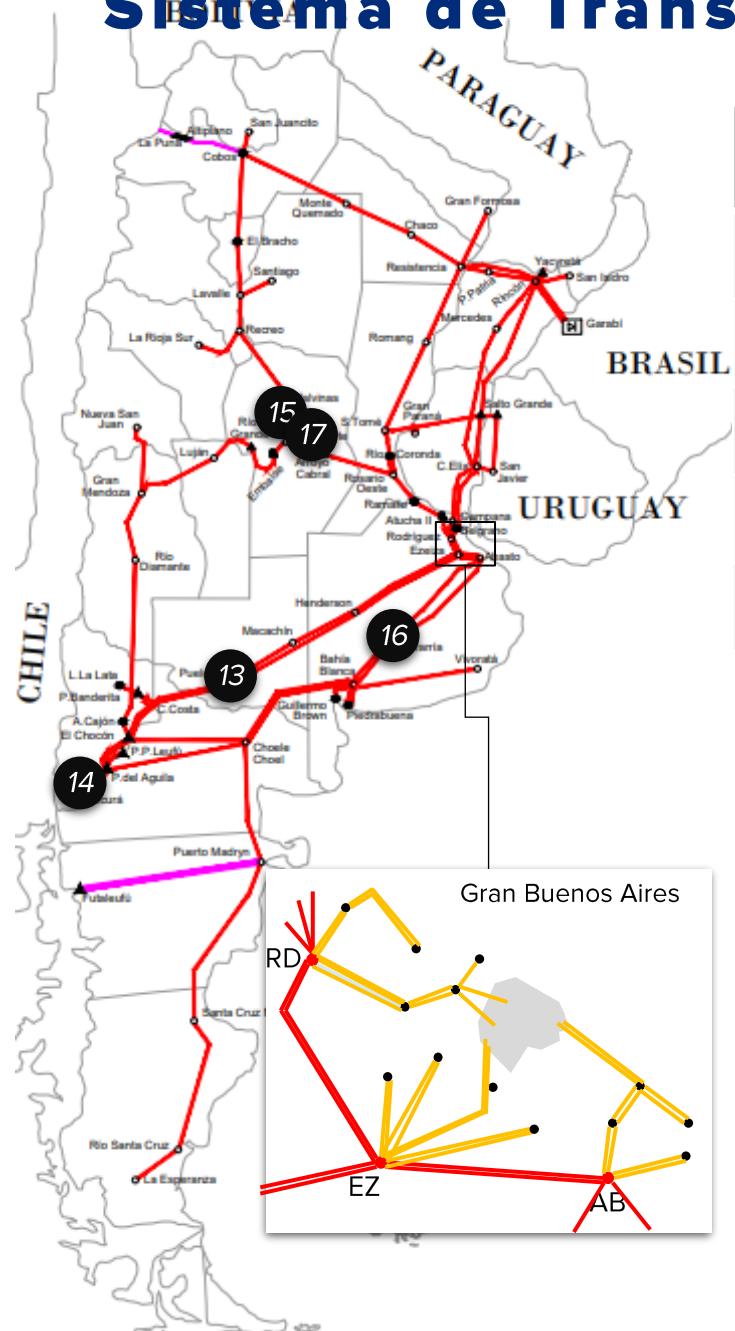


Sistema de Transporte y Distribución – Semana 16

Nuevas habilitaciones de Transporte por Distribución Troncal:

- Sin novedad.



Nuevo Equipamiento




S/N



Nuevo Equipamiento



- S/N



- El 12/04/2024 se habilitó para la Operación Comercial en el MEM el Parque Solar Fotovoltaico “Victorica” (PAMPETROL S.A.P.E.M.), con una Potencia Máxima de 7,2 MW. Se conecta en 33 kV a la E.T. Victorica, jurisdicción de APELP en la provincia de La Pampa.

